


工事のお知らせ

この度青山高原において、既設風車建替に伴う新設工事を下記のとおり実施することになりました。工事施工や工事車両通行等において、青山高原ご利用の皆様や地域の皆様にご不便をおかけしますが、一般車両優先および安全第一で作業を実施いたしますので、何卒ご理解・ご協力のほど宜しくお願いします。

記

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|----|
| 1, 工事件名 | 青山高原風力発電所リプレースのうち
風車設備工事 他 | |
| 2, 工事場所 | 三重県津市及び伊賀市
(青山高原、大山田開閉所) | 地内 |
| 3, 工事期間
(予定) | 令和 7年 3月 3日
～ 令和 9年 3月 1日 | |
| 4, その他 | ※ 風車大型部品輸送は夜間（深夜）に行います。 | |

以上

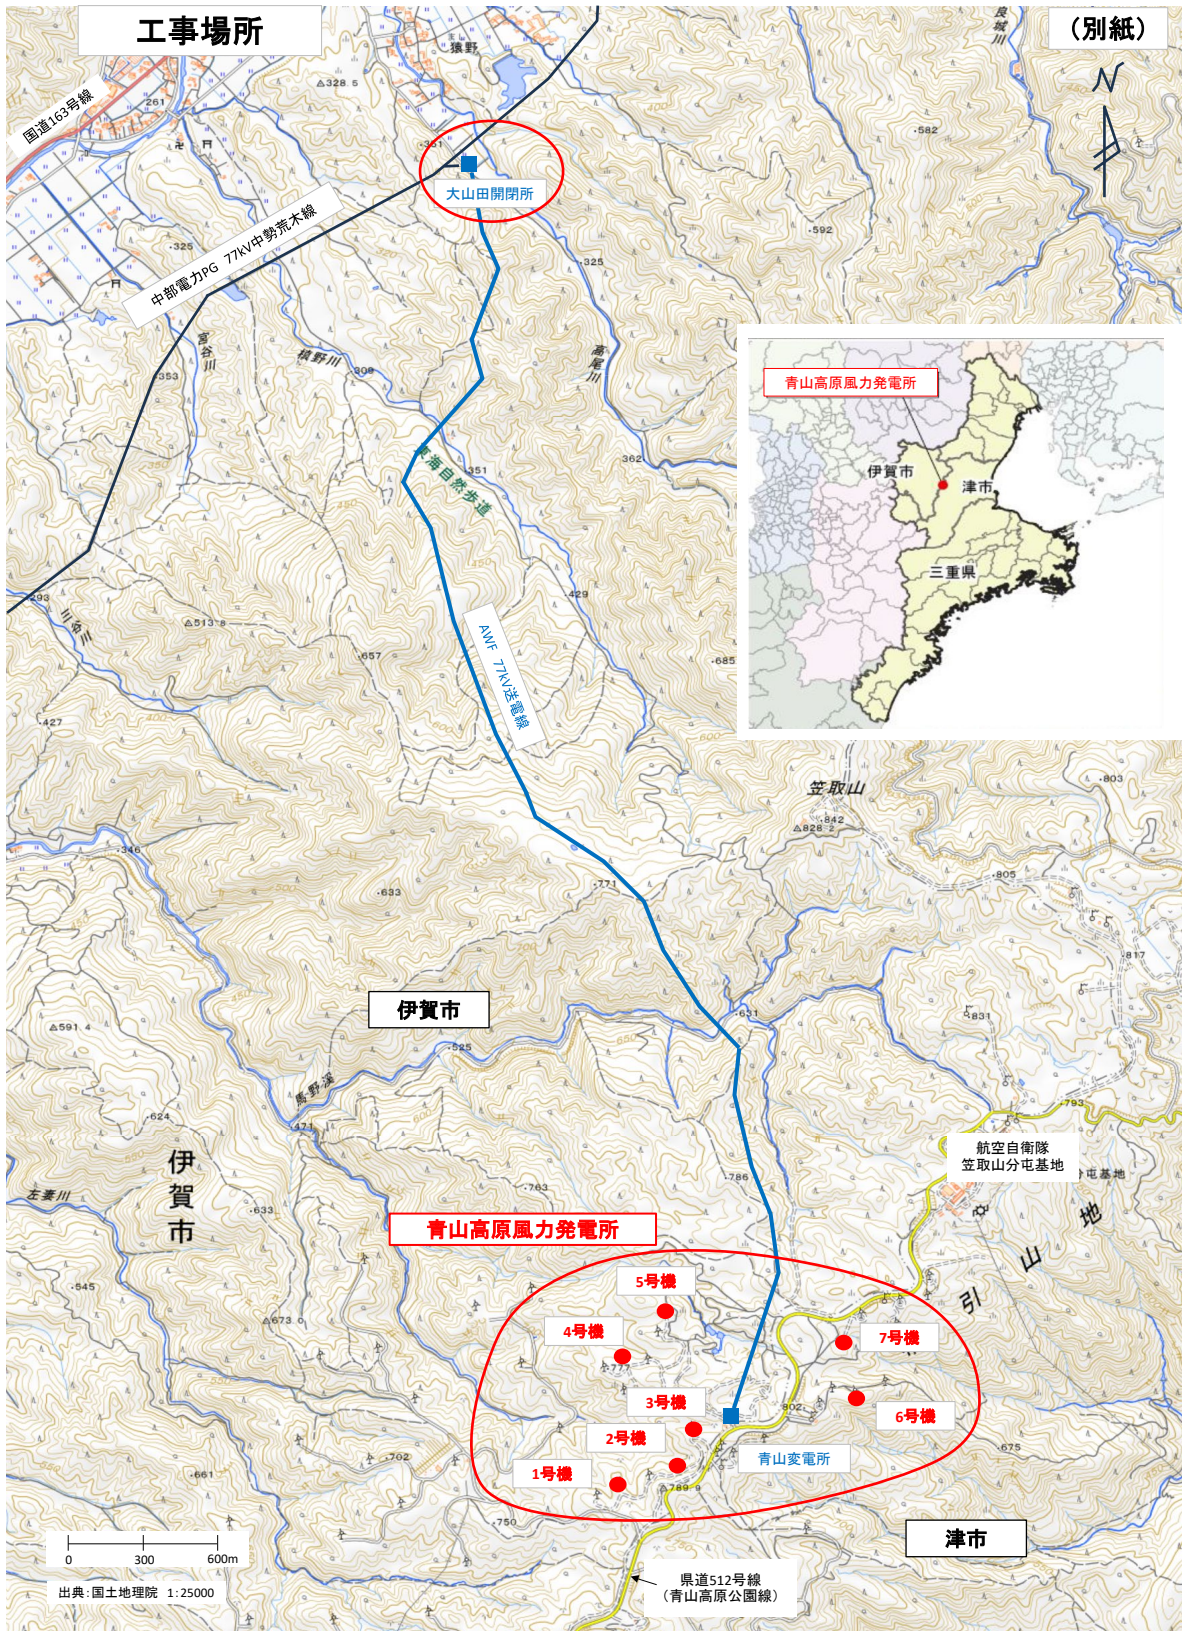

工程表(予定)

	令和7年(2025年)	令和8年(2026年)	令和9年(2027年)
風車工事	3/3 基礎工事 12/下	3/上 基礎工事 5/下 3/上 本体輸送・組立・据付 9/上 4/上 電気工事 9/中 5/下 試運転調整・試験・検査	3/1
変電所開閉所工事	7/上 工事・試験・検査 11/下	10/上 試験 11/下	
その他工事 (道路整備、地中線工事他)	3/3	12/下 3/上	10/下

※ファンデーションセクション(風車基礎中心鋼材)は、基礎工事進捗に合わせて松阪港～現地へ夜間輸送(各号機毎1日間)します。
 ※風車本体の大型部品輸送は、現地組立進捗に合わせて松阪港～現地へ夜間輸送します。
